

CP4000 Constructieformulier

Dit formulier is vereist om ervoor te zorgen dat de locatie voor uw ChargePoint EV-laadstation(s), door u of door de door u gekozen aannemer, is voorbereid zoals gespecificeerd voordat u begint met de installatie van uw laadstation. Dien dit ingevulde formulier en de vereiste foto's in via installdispatch@chargepoint.com. De gedetailleerde gegevensbladen, handleidingen voor locatieontwerp en installatiehandleidingen met ChargePoint-specificaties zijn online te vinden op: cpglobal.learnupon.com.

BELANGRIJK: Alle installaties moeten voldoen aan alle toepasselijke normen. ChargePoint biedt richtlijnen voor betonnen sokkels in de Handleiding voor locatieontwerp CP4000 die van toepassing is op de meeste locaties. De grootte van een bepaalde locatie kan echter verschillen vanwege de omstandigheden op die locatie. Zorg ervoor dat de locatietekeningen zijn voltooid en goedgekeurd voor deze locatie door een bouwkundig ingenieur.

Opmerking: Als de installateur van uw laadstation uw laadstation komt installeren en deze onderdelen niet volledig aanwezig zijn, worden afzonderlijke kosten voor het sturen van een nieuwe installateur in rekening gebracht.


Locatie-informatie	Informatie over de aannemer
Adres locatie:	Bedrijfsnaam:
	Naam locatieleider:
Aantal CP4000-laadstations dat moet worden geïnstalleerd Sokkel: Wand:	Functietitel locatieleider:
Naam contactpersoon:	E-mailadres locatieleider:
Telefoonnummer contactpersoon:	Telefoonnummer locatieleider:
E-mailadres contactpersoon:	Datum begin werk: (dd/mm/jjjj):

Maak de volgende foto's tijdens het constructieproces op de locatie.

Vereiste foto's	
	1. Betonplaat met ankerbouten, leiding en draad voor elk laadstation -of- Wandstationlocatie met leiding en draad voor elk laadstation
	2. Algehele ruimte rond het betonnen funderingsblok, waarop alle servicespelingen zichtbaar zijn
	3. Het specificatieplaatje van het elektrische paneel om de totale paneelcapaciteit aan te geven
	4. Het open elektrische paneel met het spanningsloze voorpaneel verwijderd, zodat de aansluitingen zichtbaar zijn
	5. Het open elektrische paneel met het spanningsloze front aanwezig, met de vermelding van ampèrages en labels voor CP4000-aansluitingen

Civiele werkzaamheden - Sokkelmontage	
	1. Een nieuwe betonplaat is ontworpen en goedgekeurd door een bouwkundig ingenieur voor deze specifieke locatie, of er is een nieuw gestorte plaat met: • Ten minste 600 mm aan elke zijde, inclusief ondergronds. • Is conform één van de drie aanbevolen sokkelontwerpen in de Handleiding voor locatieontwerp. • Minimaal betonsterkteklasse C30. -of- Een bestaande betonplaat met: • Een betonvolume van minimaal 0,23 m³ • Een betondiepte van minimaal 150 mm dik. • Bevestigingsbouten ten minste 138 mm verwijderd van de rand van de plaat, gemeten vanaf het midden van een bout. Opmerking: UNIMI produceert en verkoopt geprefabriceerde beton- en kunststof-funderingen. ChargePoint keurt de installatie van CP4000-laadstations op geprefabriceerde UNIMI beton- of kunststof-funderingen goed, volgens de instructies die UNIMI verstrekt. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van ChargePoint als u vragen hebt.
	2. Vier ankerbouten die 55 mm +/- 5 mm boven het beton uitsteken. De bouten zijn loodrecht en vastgezet in beton of epoxy.
	3. Het midden van de uitstekende leiding (a) bevindt zich ten minste 230 mm van obstakels achter die leiding.
	4. De leiding steekt 300-600 mm boven het beton uit.
	5. Muren, hekken of hellingen voorkomen niet dat water vanaf het funderingsblok kan stromen.

a

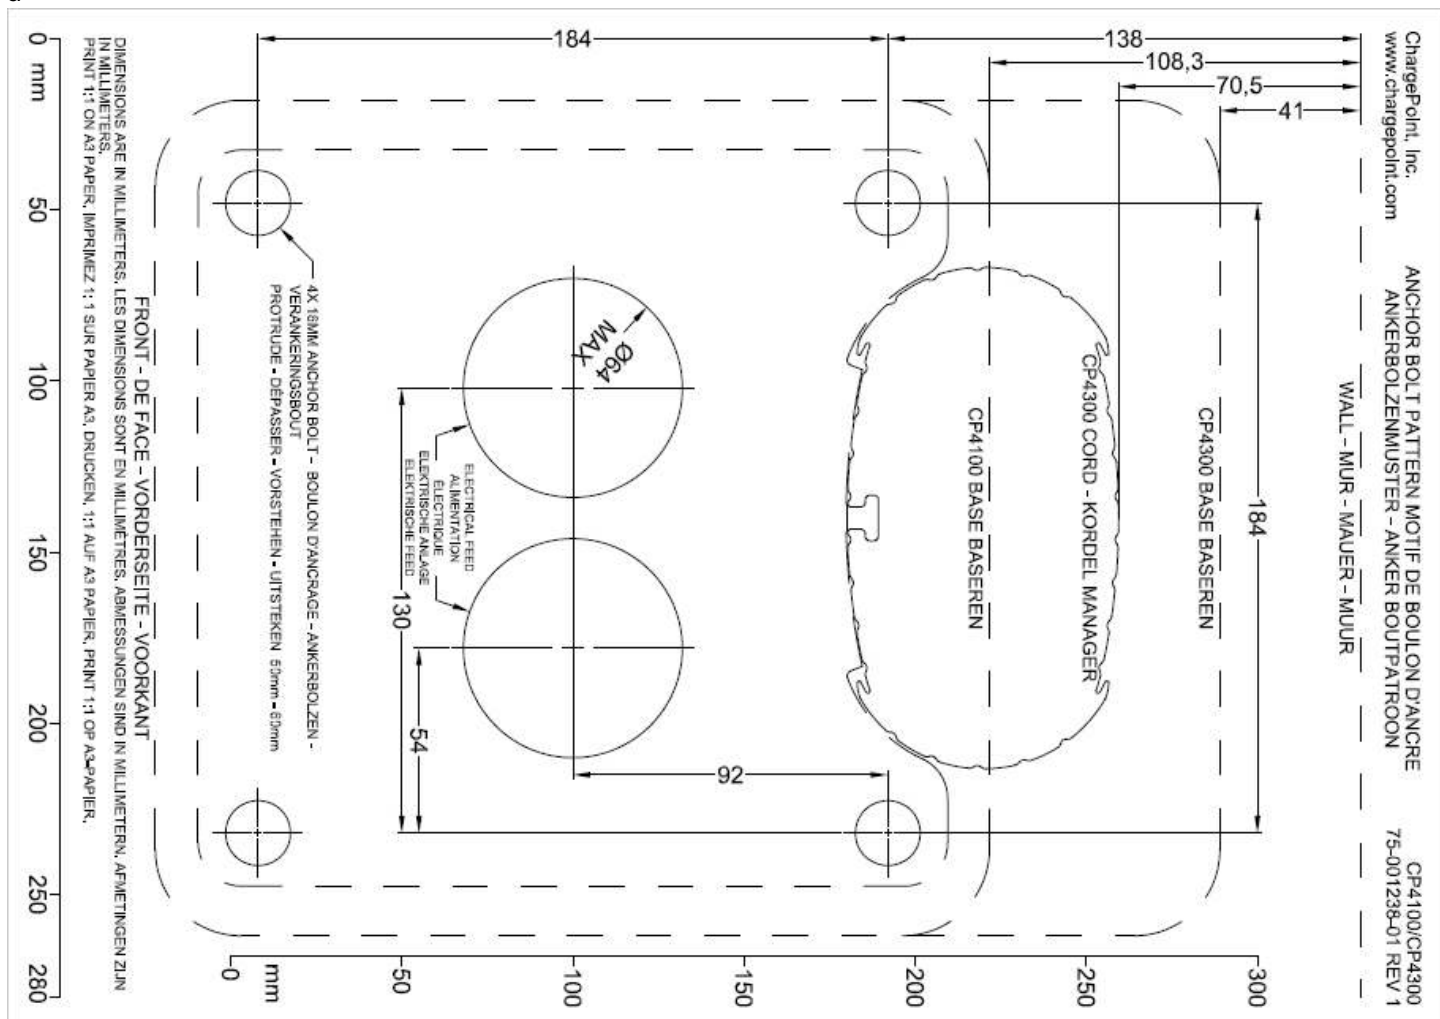

Civiele werkzaamheden – Wandmontage

1. Leiding leidt draden naar het laadstation.
2. Voor de installatie wordt 900 mm draad geleverd.
3. De wand is vlak, loodrecht, stabiel en sterk.

Elektrische werkzaamheden

	1. De elektrische infrastructuur is voltooid in overeenstemming met alle toepasselijke normen en ChargePoint-specificaties.
	2. De juiste circuitbeveiligingsvoorzieningen beveiligen elk laadpunt.
	3. Elke stroomonderbreker is nieuw (of in goede staat).
	4. Stroomonderbrekers zijn correct gelabeld in het paneel.
	5. De montagelocatie van het laadstation is getest op dekking van het 3G-netwerk en heeft een RSSI van -85 dBm of hoger (en een ECIO van -10 of hoger).

Gereedheid voor installatie

	1. Alle verpakkingen met laadstations zijn geleverd en beschikbaar, en de inhoud is onbeschadigd.
	2. Als interne faserotatie tussen poorten gewenst is, wordt L1-naar-L2-jumper geleverd.
	3. De installatielocatie is schoon en veilig voor installatie.

Opmerkingen over de locatie

--

Hierbij verklaar ik, _____, dat de werkzaamheden zoals vermeld in dit formulier correct zijn uitgevoerd.

Handtekening	Datum



chargepoint.com/support

75-001406-08 r1
