

Avstämningsformulär för konstruktion av CP4000

Det här formuläret krävs för att säkerställa att platsen för din(a) ChargePoint elbilladdningsstation(er) har förberetts enligt vad som angetts av dig eller av vald entreprenör innan installationen av laddningsstationen påbörjas. Skicka det ifyllda formuläret och de foton som specificeras till installdispatch@chargepoint.com. De detaljerade datablad, platsdesignguiderna och installationsguiderna som definierar ChargePoint-specifikationerna finns online på: cpglobal.learnapon.com.

VIKTIG! a installationer måste uppfylla alla tillämpliga regelverk. ChargePoint ger vägledning för betongpiedestaler i Guide för utformning av platsen för CP4000 som är tillämpbar för de flesta platser, men storleken för en given plats kan variera på grund av förhållandena på platsen. Se till att platsritningarna har slutförts och godkänts av en ingenjör inom byggnadskonstruktion för den här platsen.

Obs: Om stationsinstallatören anländer för att installera din station och upptäcker att dessa steg inte är slutförda debiteras du en separat avgift för omsändning.


Platsinformation	Entreprenörsinformation
Platsadress:	Företagsnamn:
	Platschefens namn:
Antal CP4000-stationer som ska installeras Piedestal: Vägg:	Platschefens jobbtitel:
Kontakttnamn:	E-postadress till platschef:
Kontakttelefon:	Platschefens telefon:
E-postadress för kontakt:	Arbetet påbörjades den (dd/mm/åååå):

Ta följande foton under hela byggprocessen.

Bilder som krävs	
	1. Betongplatta med ankarbultar, kabelkanal och kabel för varje station -eller- Plats för väggstation med kabelkanal och kabel för varje station
	2. Totalt utrymme runt betongplattan som visar att alla serviceutrymmen är åtkomliga
	3. Elcentralens specifikationsdekal som visar centralens totala kapacitet
	4. Den öppna elcentralen med den ej strömsatta frontpanelen borttagen för att visa terminatorer
	5. Den öppna elcentralen med den ej strömsatta frontpanelen på för att visa brytarnas märkström och etiketter för CP4000-anslutningar

	Ingenjörarbete – plintmontering
	1. En ny betongplatta utformades och godkändes antingen av en ingenjör inom byggnadskonstruktion för den här specifika platsen eller är en nygjuten platta som: • är minst 600 mm på varje sida, inklusive under jord. • följer ett av de tre rekommenderade plintmönstren i Guiden för anläggningens formgivning. • Betongklass C30 minimum. -eller- En befintlig betongplatta med: • en minsta betongvolym på 0,23 m³ • ett minsta betongdjup på 150 mm. • Monteringsbultar som är placerade minst 138 mm från plattans kant mätt från mitten av en bult. Obs! UNIMI tillverkar och säljer prefabricerade betong- och plastfundament. ChargePoint godkänner installation av CP4000 laddstationer på prefabricerade UNIMI betong- eller plastfundament, enligt de instruktioner som tillhandahålls av UNIMI. Kontakta ChargePoint försäljningsavdelning om du har frågor.
	2. Fyra ankarbultar sticker ut 55 mm +/- 5 mm ovanför betongen. Bultarna är lodräta och säkra i betong eller epoxi.
	3. Mitten av kabelkanalsänden (a) är minst 230 mm från hinder på baksidan.
	4. Kabelkanalen sträcker sig 300–600 mm ovanför betongen.
	5. Väggar, staket eller sluttningar förhindrar inte att vatten dräneras från plattan.

a

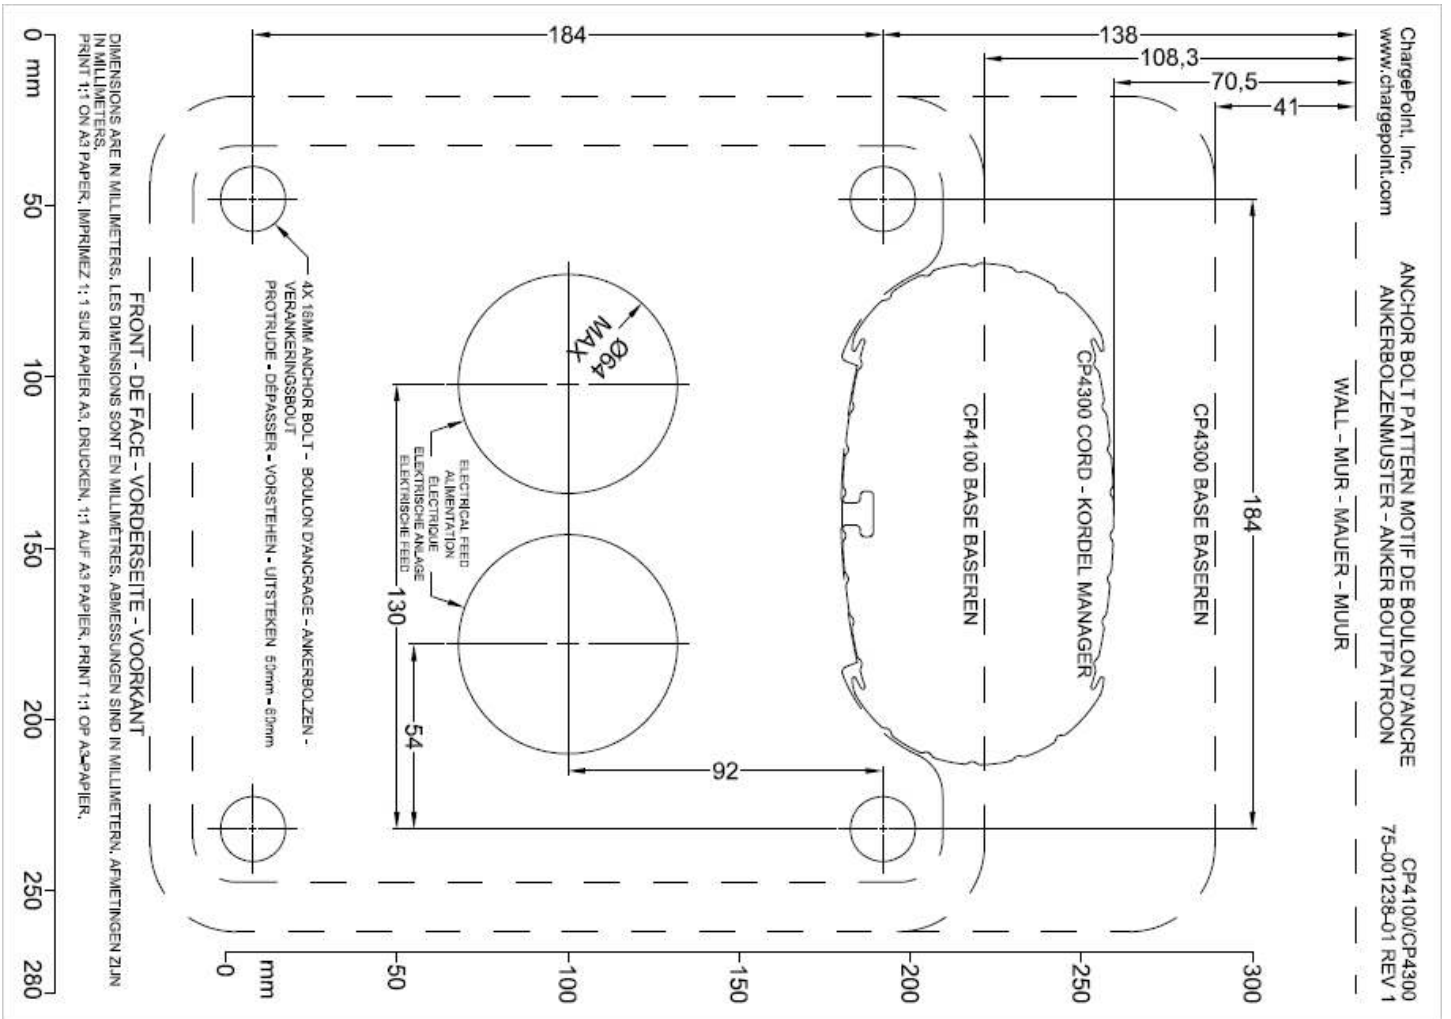

Ingenjörarbete - väggmontering

1. Kabelkanalen leder kabeln till stationen.
2. 900 mm kabel medföljer för installation.
3. Väggens är jämn, lodrät, stabil och stark.

Elektriskt arbete

	1. Den elektriska infrastrukturen har slutförts i enlighet med alla tillämpliga regelverk och ChargePoint-specifikationer.
	2. Lämpliga kretsskyddsenheter skyddar varje laddningsport.
	3. Varje krets brytare är ny (eller i gott skick).
	4. Krets brytare är korrekt märkta i centralen.
	5. Stationens monteringsplats har testats för 3G-mobiltäckning och visar en RSSI på -85 dBm eller bättre (och en ECIO på -10 eller bättre).

Installationsberedskap

	1. Alla stationslådor är levererade, tillgängliga och innehållet är oskadat.
	2. Om intern fasförskjutning mellan portar önskas levereras bygel n L1 till L2.
	3. Installationsplatsen är ren och säker för installation.

Platskommentarer

--

Jag, _____, bekräftar att det arbete som är beskrivet i det här formuläret har utförts på rätt sätt.

Signatur	Datum



chargepoint.com/support

75-001406-10 r1
